



INFORME A LA H.ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR **INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL** **DE AGUA A DICIEMBRE DE 2018**

Cartagena de Indias D.T.C., 25 de abril de 2019



1. GESTIÓN FINANCIERA A DIC. 2018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

COMPONENTE	SGP Depto	SGP Municipios	Recursos Nación	Regalías Depto	Regalías Mpios	Otros Recursos Depto	Otros Recursos Mpios	TOTAL RECUR. ASIGNADOS	RECURSOS EJECUT.	% DE EJEC.
ASEGURAMIENTO	6.449,25	1.020,00	0	0	0	0	0	7.469,25	7.469,25	100,00%
Gestor	4.344,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,25	4.344,25	100,00%
Aseguramiento Regional	555	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	100,00%
Calidad de Agua PABACA	600	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
Social	950	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950	950	100,00%
INFRAESTRUCTURA	6.970,16	5.490,40	439,51	2.671,50	0	25.114,00	0	40.685,58	33.998,30	83,56%
Pre-inversiones	200	140	0	0	0	0	0	340	340	100,00%
Reformulaciones	2.373,01	354,87	0	358,9	0	0,00	0	3.086,78	3.086,79	100,00%
Obras AAA	3.117,27	4.963,81	439,51	2.088,19	0	24.238,40	0	34.847,19	29.486,30	84,62%
Interventoría	1.279,88	31,72	0,00	224,41	0	875,6	0	2.411,61	1.085,21	45,00%
GESTIÓN AMBIENTAL	90	0	0	0	0	0	0	90	0	0,00%
Mínimos Ambientales Sectoriales	90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90	0	0,00%
Cierre Botadero	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Áreas Estratégicas	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGO SECTORIAL	1.062,50	5.309,52	0	63,17	0	0	0	6.435,19	1.188,12	18,46%
Conocimiento	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Reducción	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0
Atención del Desastre	1.062,50	5.309,52	0,00	63,17	0,00	0	0,00	6.435,19	1.188,12	18,46%
COMPROMISOS FINANCIEROS	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00%
Provisión Servicio de la Deuda - Departamento de Bolívar - (Año 1)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	0	0,00%
TOTAL PAEI 2018	15.571,91	11.819,92	439,51	2.734,67	0	25.114,00	0	55.680,02	42.655,67	76,61%

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: AVANCE METAS PDD 2016-2019

INDICADOR	META PRODUCTO A 2019	AVANCE META A DIC 2018	% AVANCE META 2019
cobertura agua potable cabecera municipal	11 proyectos entregados	• Santa Rosa del Sur. • Magangué (aporte Proyecto Findeter) • San Cristóbal. • San Jacinto del Cauca. • Plan de choque regional La Línea.	45,5%
cobertura agua potable zona rural	25 proyectos entregados	• Cascajal y Ceibal (Magangué) • Las Piedras (San Estanislao) • Macayepo (El Carmen) • Paiva y Chiricoco (Sta. Rosa de Lima) • Cañaveral (Turbaco) • Tacamocho (Córdoba) • Tenche (San Jacinto del Cauca) • Doña Juana (Margarita)	40%
Cobertura alcantarillado cabecera municipal	7 proyectos entregados.	(En obras: El Carmen, Córdoba, Arroyohondo, San Cristóbal y Calamar-fase 1)	0
Cobertura de aseo cabecera municipal	3 proyectos entregados.	• Relleno San Cristóbal (Soplaviento y Arroyohondo). • Relleno regional del sur (Simití, Santa Rosa, San Pablo, Cantagallo).	66,6%
Calidad de agua	Apoyar a 45 mpios para reducir prom. IRCA a 5%	40 municipios	88,8%

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: INDICADORES DE COBERTURA

NOMBRE INDICADOR	LÍNEA BASE 2016	% AVANCE A 2018	METAS DE RESULTADO A 2019
cobertura agua potable cabecera municipal	85%	94%	Aumentar a 100%
cobertura agua potable zona rural	35%	42.5%	Aumentar a 50%
Cobertura alcantarillado cabecera municipal	20%	20%	Aumentar a 35%
Cobertura de aseo	44%	54%	Aumentar a 55%
Calidad de agua	36 mpios apoyados IRCA: 33%	40 mpios apoyados IRCA: 20,6%	Apoyar a 45 mpios para reducir prom. IRCA a 5%
Promedio continuidad del servicio	13 h/día	15 h/día	Aumentar promedio a 18 h/día

2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: PROYECTOS ENTREGADOS 2018

MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA ENTREGA	VALOR (MILL. \$)	POB. TOTAL BENEFIC.
SAN JACINTO DEL CAUCA	Construcción sistema de acueducto	7-02-2018	5.033	4.134
LA LÍNEA (Villanueva, Santa Rosa-San Estanislao-Soplaviento)	Plan de choque optimización acueducto	21-08-2018	3.398	52.997
TACAMOCHO (CÓRDOBA)	Construcción sistema abastecimiento de agua potable	28-09-2018	1.188	3.234
TOTAL				



PROYECTOS ENTREGADOS 2018

Regional La Línea



PROYECTOS ENTREGADOS 2018

Tacamocho (Córdoba)



2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO	INVERSIÓN (mm \$)	OBJETO	POB.BENEF	% AVANCE A DIC.2018	% AVANCE A ABR.2019
MOMPÓS	5.456	Optimización PTAP	26.137	95	100
NOROSÍ	1.584	construcción sistema de acueducto	2.116	90	96
MONTERISTO	6.498		11.789	54	58
CÓRDOBA	15.317	construcción sistema de alcantarillado	3.087	99,5	100
ARROYOHONDO	6.504		6.774	82	87
EL PEÑÓN	5.215	construcción sistema de acueducto	3.890	92	98
JUANARIAS (MAGANGUÉ)	3.399		3.855	64	85
SAN JUAN-SAN JACINTO	17.221		46.848	86	94
EL CARMEN DE BOL.	60.085	construcción sistema de alcantarillado	59.209	65	71


2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA: PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO	INVERSIÓN (mm \$)	OBJETO	POB. BENEFIC	% AVANCE A DIC.2018	% AVANCE A ABR.2019
ARROYOHONDO- HATOVIEJO	1.307	Rehabilitación PTAP y captación	7.042	93	98
CALAMAR	2.032	Construcción fase 1 sistema alcantar/.	13.788	55	87
TURBANA	16.127	Construcción sistema de acueducto	14.278	22	32
BALLESTAS (TURBANA)	349	Construcción pozo subterráneo	2.700	2	5
MOMPÓS (proyecto Findeter)	8.000	Ampliación Sistema alcantarillado	26.137	24	40
PATIVACA-ARENAS DEL SUR Y PUERTO PRÍNCIPE (EL CARMEN)	212	Construcción sistema de abastecimiento	450	2	10


ALCANTARILLADO EL CARMEN DE BOLÍVAR



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO EL CARMEN DE BOLÍVAR

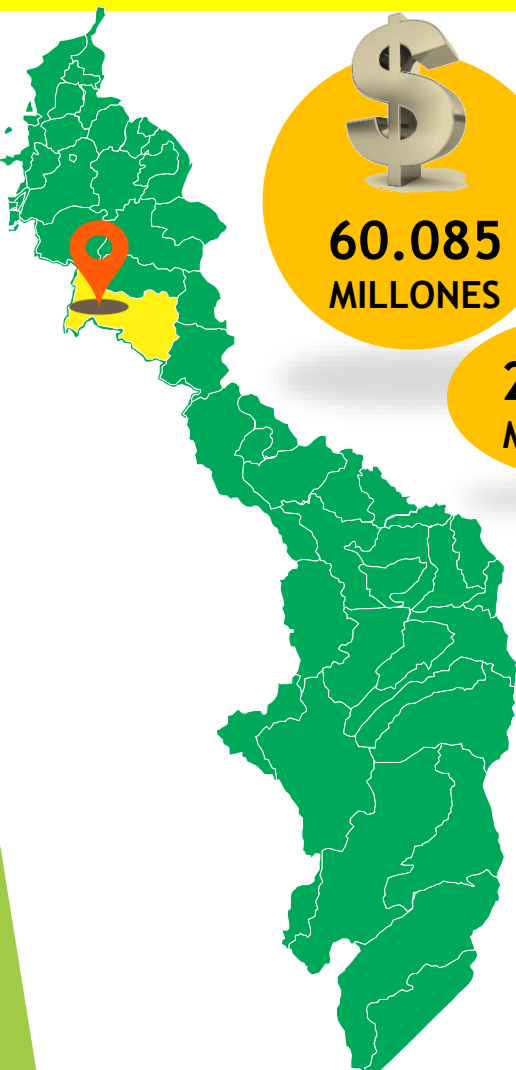

¿QUÉ FALTA?

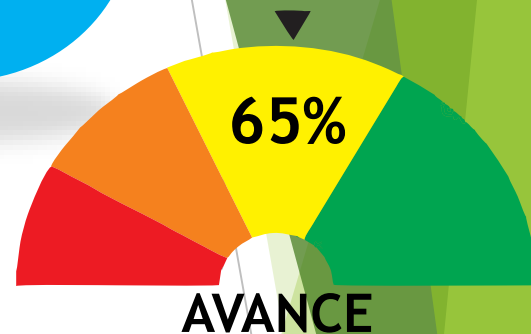


- Fundir muros de filtros percoladores.
- Lecho secado de lodos.
- Instalaciones eléctricas.
- Carpintería caseta de operaciones.
- Redes: empalme de colector principal, tubería conexiones domiciliarias y tramo emisario final El Carmen-Plato.



ACUEDUCTO REGIONAL SAN JUAN-SAN JACINTO



CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO REGIONAL SAN JUAN-SAN JACINTO

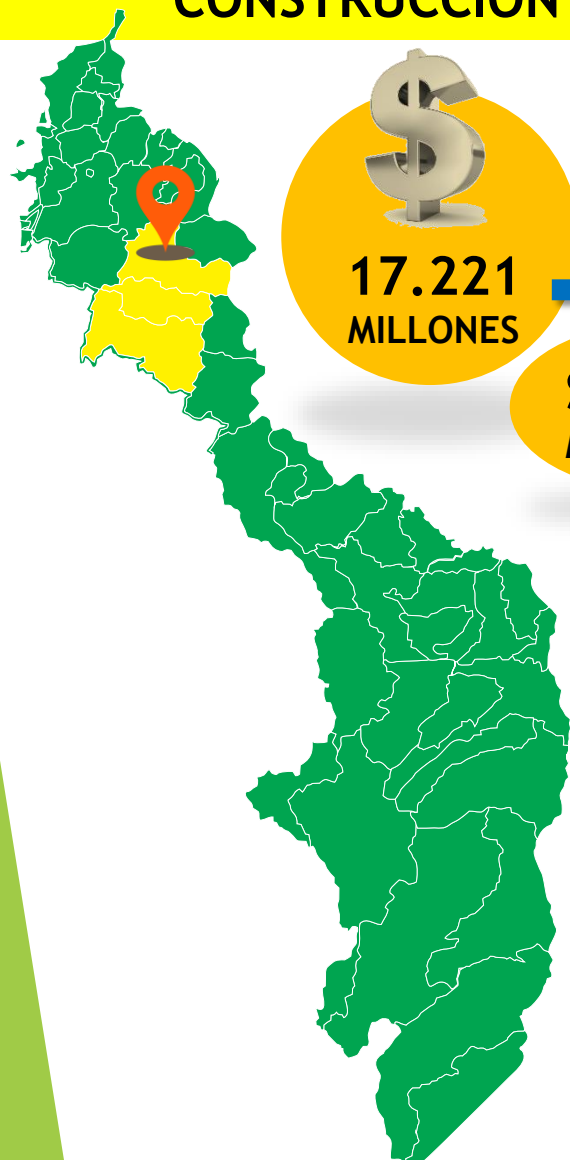

46.848
HAB.



235
EMPLEOS

¿QUÉ FALTA?

- Plataforma acceso a barcaza.
- Instalación 2/3 motores estación de bombeo San José del Peñón.
- Empalme aducción a desarenador.
- Limpieza tanque existente.
- Sistema eléctrico El Palmar.
- 24 mts de conducción PTAP - San Jacinto.



AVANCE



MAYO 2019

Aguas de Bolívar
S.A. E.S.P.



REHABILITACIÓN PTAP Y CAPTACIÓN - MOMPÓS




REHABILITACIÓN PTAP Y CAPTACIÓN - MOMPÓS



¿QUÉ FALTA?

Instalaciones
eléctricas y empalme
tubería de captación
a PTAP.

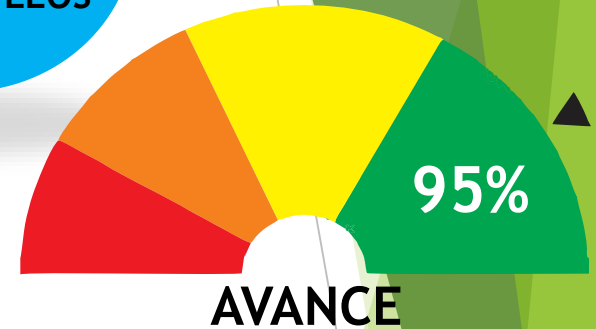

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE EL PEÑÓN




CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE EL PEÑÓN



¿QUÉ FALTA?

Instalación
equipos de
dosificación.

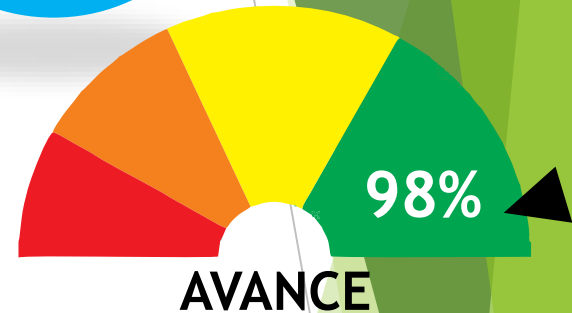


Aguas de Bolívar
S.A. E.S.P.



CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE JUANARIAS (MAGANGUÉ)



CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE JUANARIAS (MAGANGUÉ)

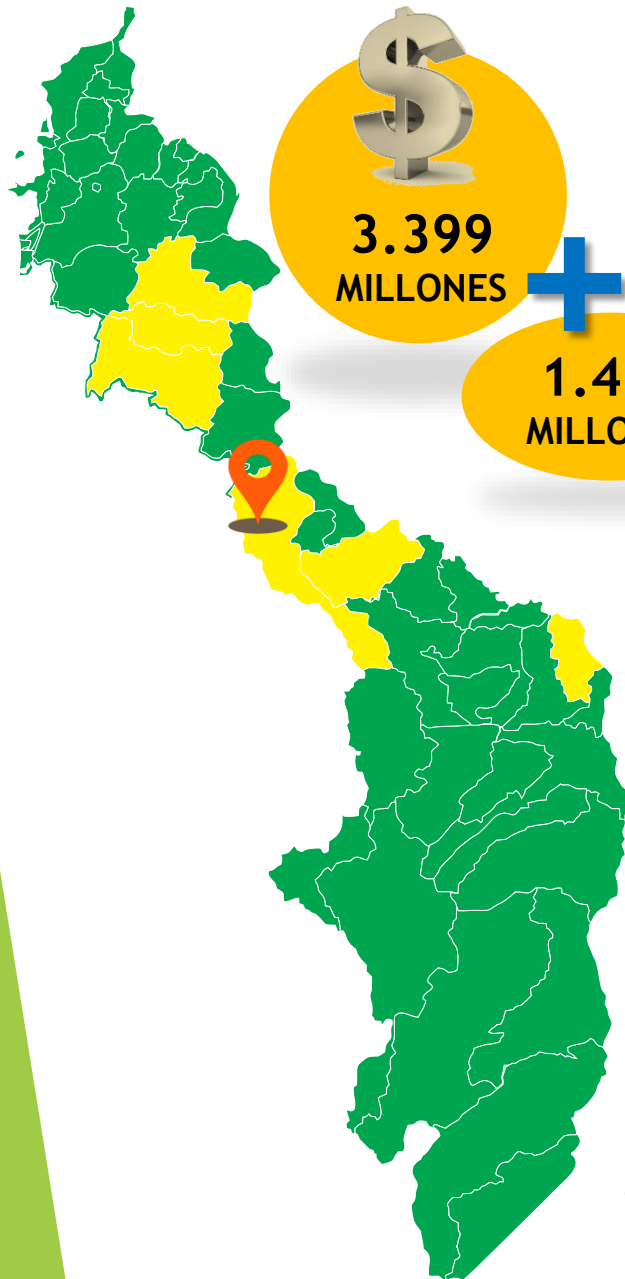


3.399
MILLONES



1.435
MILLONES




3.855
HAB.



¿QUÉ FALTA?


Terminar tanque
elevado y sistema
eléctrico.

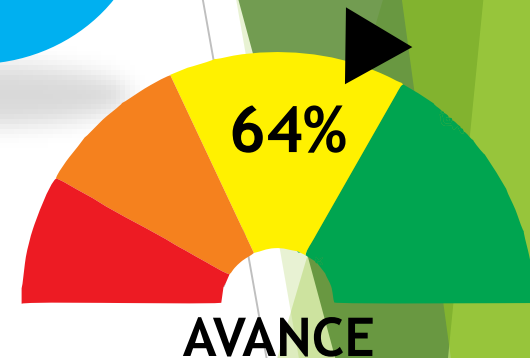

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE MONTECRISTO



CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE MONTECRISTO

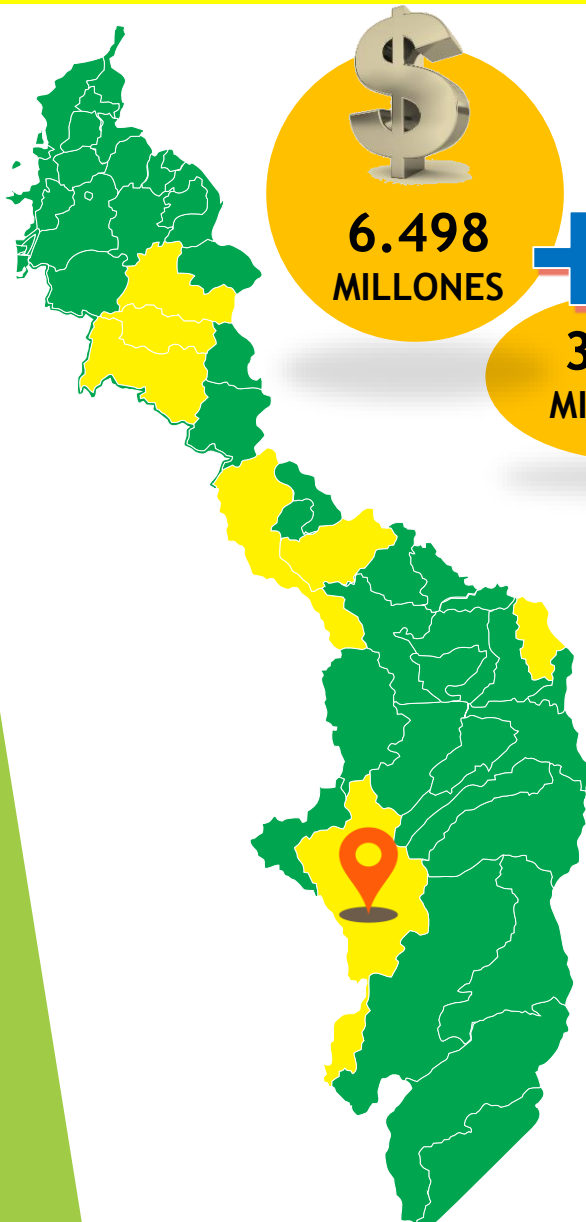


6.498
MILLONES



3.238
MILLONES



11.789
HAB.




70

EMPLEOS

¿QUÉ FALTA?

- Instalar planta compacta 25 lts/seg.
- Terminar desarenador y captación.

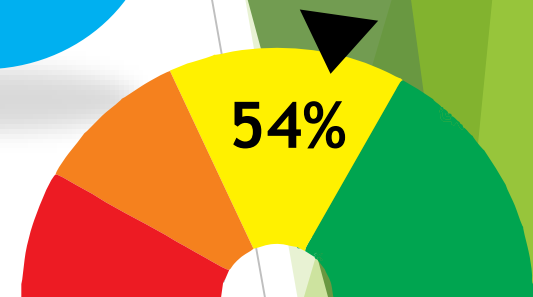

AVANCE



NOV. 2019

Aguas de Bolívar
S.A. E.S.P.



CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE NOROSÍ



CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE NOROSÍ



**6.498
MILLONES**



**250
MILLONES**




**11.789
HAB.**



**21
EMPLEOS**

¿QUÉ FALTA?

- Conectar tubería conducción a quebrada.
- Construcción muro en gaviones.

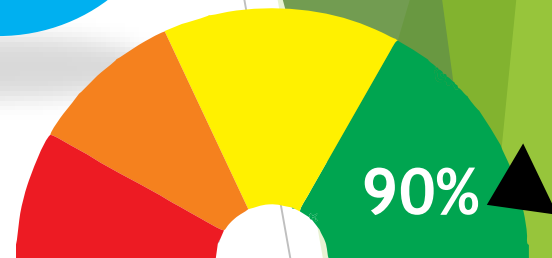

AVANCE



ABRIL 2019


Aguas de Bolívar
S.A. E.S.P.



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE ARROYOHONDO



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE ARROYOHONDO

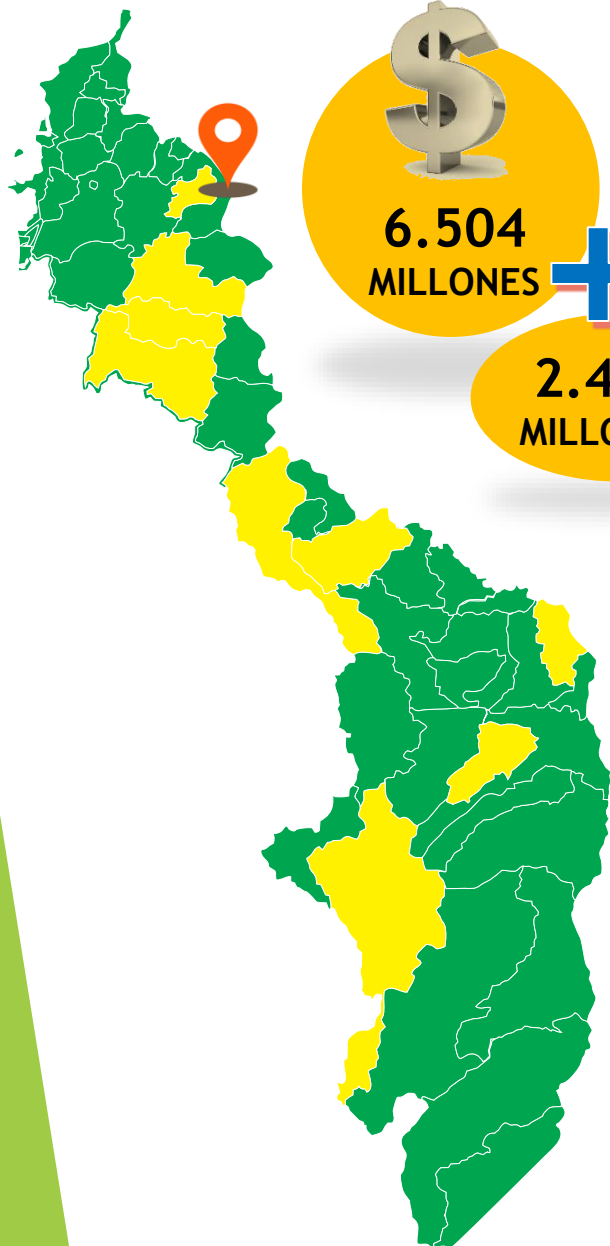


6.504
MILLONES



2.499
MILLONES




6.774
HAB.



¿QUÉ FALTA?

Laguna de
oxidación, hoy en
50%

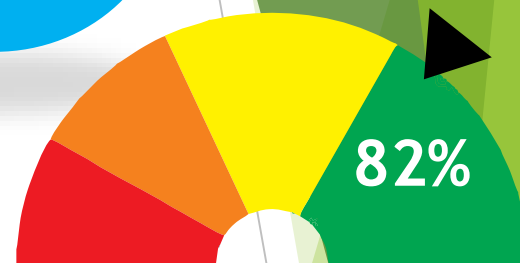

AVANCE



MAYO 2019

Aguas de Bolívar
S.A. E.S.P.



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE CÓRDOBA




CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE CÓRDOBA



¿QUÉ FALTA?


Pruebas técnicas
para entrar en
funcionamiento.

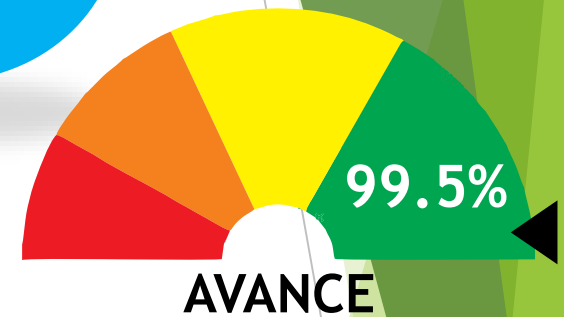

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE CALAMAR - FASE 1




CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO DE CALAMAR - FASE 1

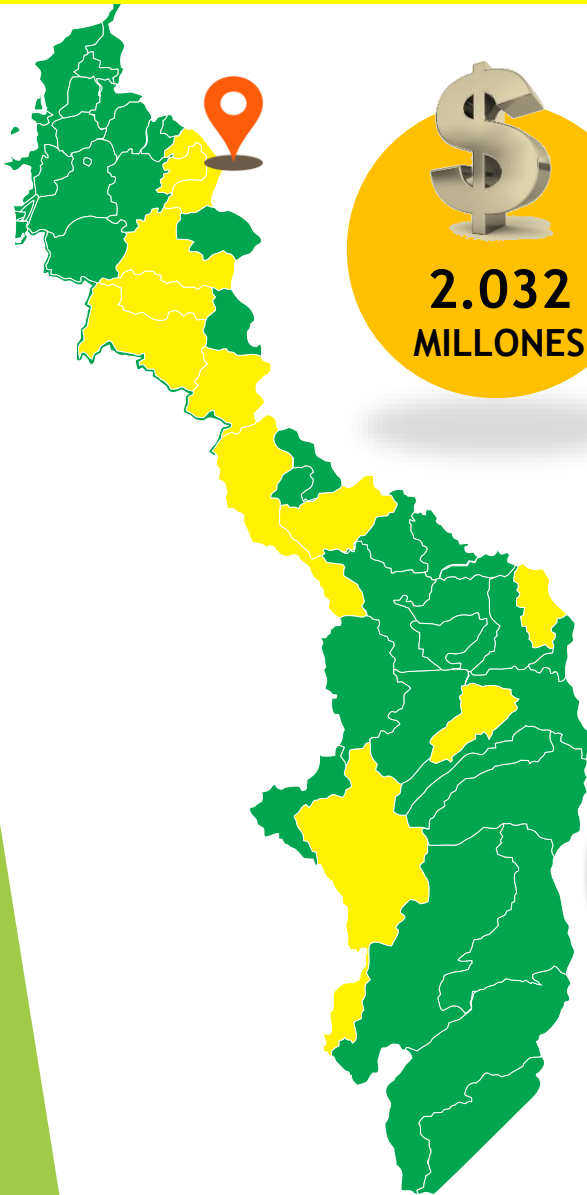

¿QUÉ FALTA?

Instalación 200 mts.
lineales de tubería
del colector y 8
manhol.

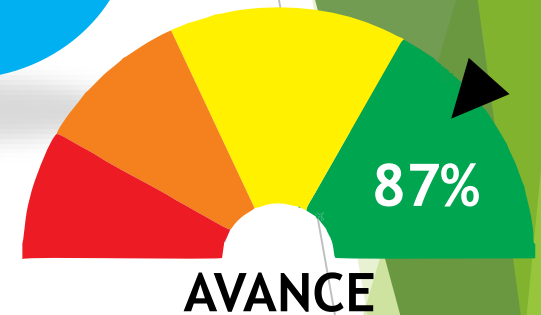

Aguas de Bolívar
S.A. E.S.P.



CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE TURBANA




3/2019

25


14:35

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE TURBANA

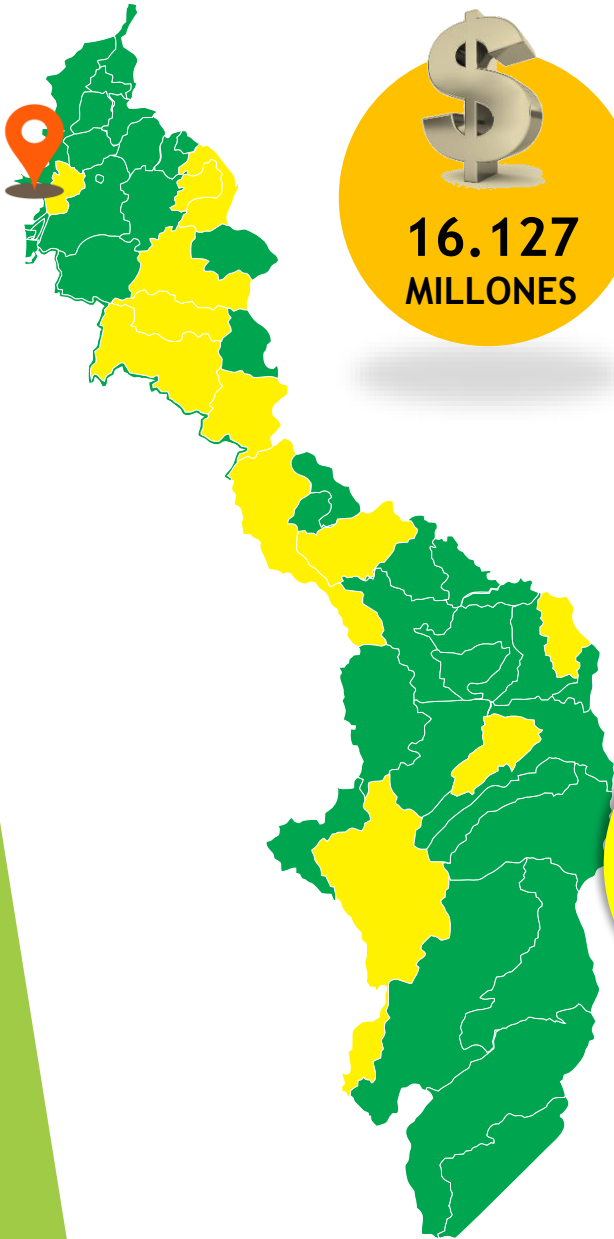

¿CÓMO VAMOS?


Se iniciaron obras
en diciembre de
2018

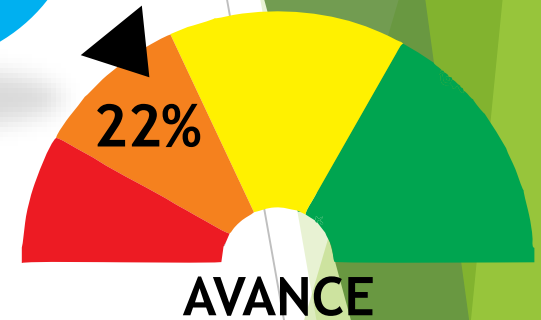

REHABILITACIÓN ACUEDUCTO HATOVIEJO (CALAMAR)




REHABILITACIÓN ACUEDUCTO HATOVIEJO (CALAMAR)

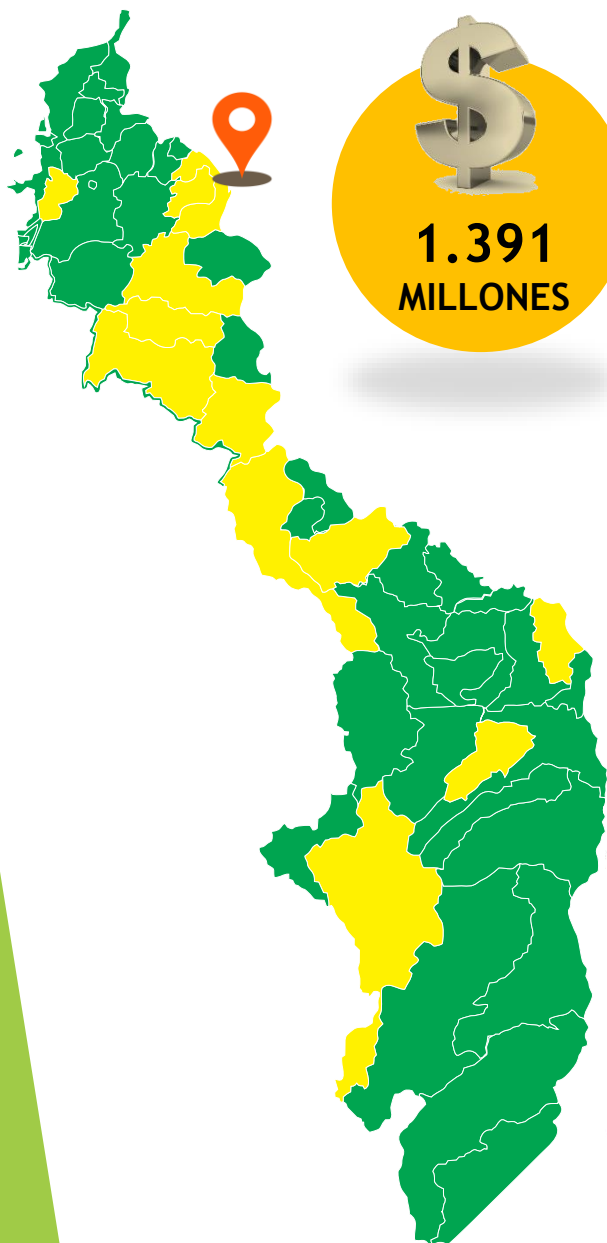

¿QUÉ FALTA?



Conexión final
del tanque de
almacenamiento
a redes en
Hatoviejo

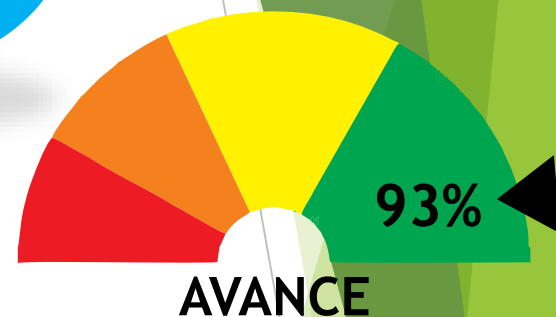

ABRIL 2019

3. CUMPLIMIENTO ORDENANZA 230/2017: PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES BOLIVARENSES RECIÉN EGRESADOS

Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. contrató durante 2018 a 20 jóvenes bolivarenses recién egresados (ver tabla) cumpliendo con lo establecido en la ordenanza No.230/2017.

AREA DE TRABAJO	No. EMPLEOS
SUBG. TÉCNICA	4
SUBG. ADM Y FINANC.	4
SUBG. ASEGURAMIENTO	1
OFICINA JURIDICA	6
OFIC. CONTROL INTERNO	1
OFIC. GESTIÓN SOCIAL	4
TOTAL	20



Aguas de Bolívar
S.A. E.S.P.

www.aguasdebolivar.com.co



Aguas De Bolivar SA Esp



Aguas de Bolivar



@aguasdebolivar



contacto@aguasdebolivar.com.co



AguasDeBolivar

Manga, Edif. Twins Bay, piso 22, calle 25 #24A 16

Tel. 6925222

Cartagena de Indias D.T. y C. - Colombia



GP-CER220243



SC-CER231921

